鴻池・平嶋・久米特定建設工事共同企業体

【第6回修正版　令和4年5月9日】

稲築東中学校区義務教育学校施設整備事業 工程表

発注者	嘉麻市	構　造	RC	階　数	地上３階	作成者
設計・監理	㈱久米設計	建築面積	㎡	着　工	2021年8月1日(日)	鴻池組 九州支店
計画地	福岡県嘉麻市平1536番地	延床面積	㎡	竣　工	2024年6月14日(金)	

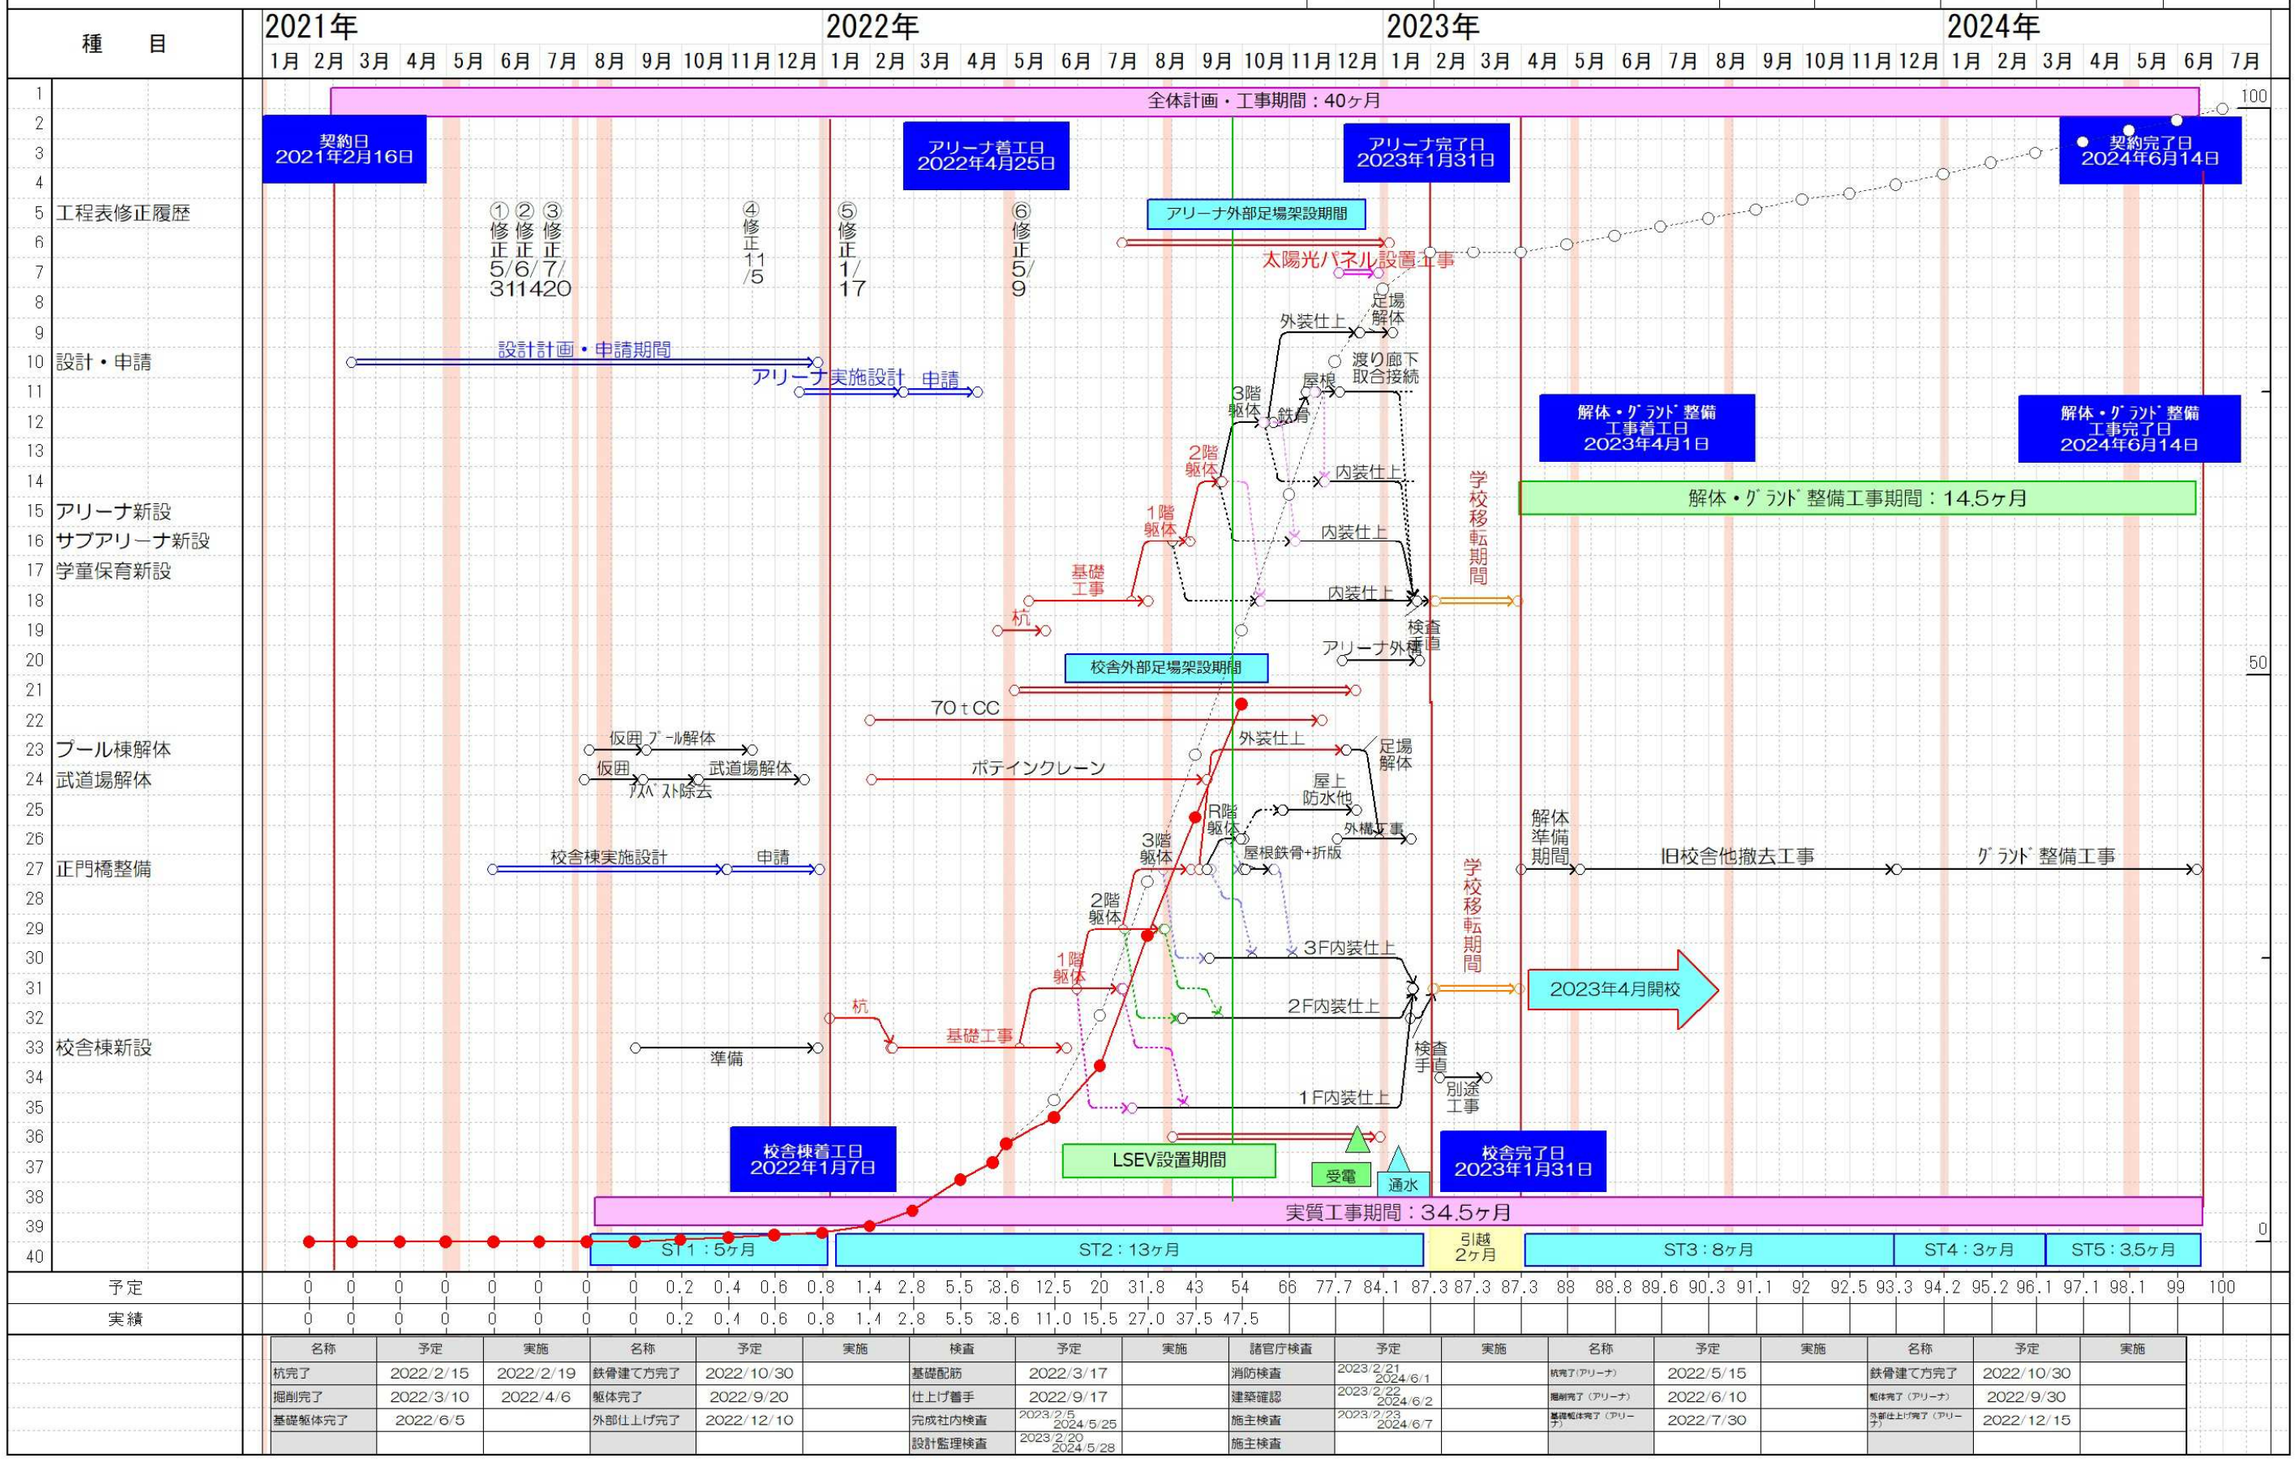

	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.4	2.8	5.5	8.6	12.5	20	31.8	43	54	66	77.7	84.1	87.3	87.3	87.3	88	88.8	89.6	90.3	91.1	92	92.5	93.3	94.2	95.2	96.1	97.1	98.1	99	100
予定																																										
実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.4	2.8	5.5	8.6	11.0	15.5	27.0	37.5	47.5																					

名称	予定	実施	名称	予定	実施	検査	予定	実施	諸官庁検査	予定	実施	名称	予定	実施	名称	予定	実施
杭完了	2022/2/15	2022/2/19	鉄骨建て方完了	2022/10/30		基礎配筋	2022/3/17		消防検査	2023/2/21 2024/6/1		杭完了(アリーナ)	2022/5/15		鉄骨建て方完了	2022/10/30	
掘削完了	2022/3/10	2022/4/6	躯体完了	2022/9/20		仕上げ着手	2022/9/17		建築確認	2023/2/22 2024/6/2		掘削完了（アリーナ）	2022/6/10		躯体完了（アリーナ）	2022/9/30	
基礎躯体完了	2022/6/5		外部仕上げ完了	2022/12/10		完成社内検査	2023/2/5 2024/5/25		施主検査	2023/2/23 2024/6/7		基礎躯体完了（アリーナ）	2022/7/30		外部仕上げ完了（アリーナ）	2022/12/15	
						設計監理検査	2023/2/20 2024/5/28		施主検査								
